

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**UNSKO-SANSKI KANTON**  
**GRAD BOSANSKA KRUPA**  
Služba za upravljanje razvojem



**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
**FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
**THE UNA-SANA CANTON**  
**THE CITY OF BOSANSKA KRUPA**  
Development management servise

---

# **IZVJEŠTAJ**

**o realizaciji strateških i drugih projekata po sektorima  
za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine**

**Oktober 2022. godine**

## **SKRAĆENICE**

**JLS – Jedinica lokalne samouprave**

**SUR – Služba za upravljanje razvojem**

**SKSPI – Služba za komunalno-stambene poslove i inspekciju**

**SCZ - Služba za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu**

**SOPDD - Služba za opću upravu i društvene djelatnosti**

**ES – Ekonomski sektor**

**DS – Društveni sektor**

**SO – Sektor zaštite okoliša**

## Sadržaj

1. UVOD .....	4
2. STRATEŠKI CILJEVI .....	5
2.1. STRATEŠKI CILJEVI STRATEGIJE RAZVOJA UNSKO-SANSKOG KANTONA 2021-2027 ...	5
2.2. STRATEŠKI CILJEVI STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE BOSANSKA KRUPA...	7
2.2.1. SEKTORSKI CILJEVI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE BOSANSKA KRUPA 2010-2020 (REVIDIRANO IZDANJE) .....	7
3. ZBIRNI PREGLED PRIORITETNIH PROJEKATA I OKVIRA ZA NJIHOVO FINANSIRANJE OBUHVAĆENIH PLANOM ZA 2021. GODINU .....	7
3.1. PROJEKTI I AKTIVNOSTI .....	9
4. MAKROINDIKATORI .....	15
Tabelarni pregled stanja realizacije strateških projekata u 2021. godini .....	16
Tabelarni pregled projekata koji su realizirani u 2021. godini a nisu bili planirani .....	21
Zaključak:.....	25

## 1. UVOD

Strategiju integriranog razvoja općine Bosanska Krupa za period 2011-2020. godine izradio je Razvojni tim Općine u periodu april 2010 – januar 2011. godine, u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDLP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), a usvojena je februara mjeseca 2011. godine. U samom dokumentu su sadržane odredbe za praćenje realizacije projekata na godišnjem nivou, o čemu se sačinjavaju godišnji izvještaji.

Sistemska praćenje i vrednovanje (monitoring i evaluacija) realizacije Strategije omogućava mjerenje ostvarenja postavljenih ciljeva te poduzimanje pravovremenih mjera u cilju eventualnih korekcija. U dokumentu Strategije integriranog lokalnog razvoja općine Bosanska Krupa 2011-2020. (u daljem tekstu Strategija), a po završetku petogodišnjeg ciklusa implementacije Strategije i isteka planskog perioda sektorskih planova, pristupilo se vrednovanju (srednjoročnoj evaluaciji) Strategije<sup>1</sup>. Tokom 2016. godine (februar-april), izvršena je nezavisna evaluacija kroz ocjenu osnovnih aspekata vrijedovanja Strategije koji se odnose na relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost.

Prema pokazateljima srednjoročne evaluacije Strategije od ukupno 157 planiranih projekata, u potpunosti je realizirano 24,84%, u provedbi se nalazi 36,31%, dok 38,85% strateških intervencija nije uopće implementirano, odnosno dio je prolongiran dok se ne steknu svi relevantni uvjeti, a dio projekata je otkazan. Stoga je u revidiranoj Strategiji bilo potrebno osigurati realnije planiranje projekata u skladu sa preporukama izvještaja o srednjoročnoj evaluaciji, a dio sektorskih ciljeva objediniti s ciljem povećanja efektivnosti.

Nakon evaluacije, u 2016. i 2017. godini je započeta revizija Strategije, a rezultat tih aktivnosti je Revidirana Strategija razvoja općine Bosanska Krupa za period 2017-2020 godina (u daljem tekstu: Strategija), koja je usvojena u decembru 2017. godine. Uz ovaj dokument je usvojen i trogodišnji Plan implementacije Strategije 2017-2019 koji predstavlja osnov za sačinjavanje izvještaja. U proteklom periodu usvojeni su i Izvještaji o godišnjem ostvarenju Strategije integriranog razvoja Općine Bosanska Krupa za 2017., 2018. i 2019. godinu te Plan implementacije Strategije 2018-2020, 2019-2021 i za 2020-2022.

Iako su u Budžetu općine bila planirana sredstva za izradu Strategije razvoja za period 2021-2025, nije se pristupilo izradi zbog situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa. U mjesecu decembru 2020. je donesena Odluka o izradi Strategije razvoja za period 2021-2027 i imenovan Odbor za razvoj. Obzirom da su aktivnosti započete u periodu kada je rad bio ograničen i uslovljen epidemiološkom situacijom vezanom za pandemiju COVID 19 i dugotrajnom bolešću angažiranog certificiranog trenera za izradu strateških dokumenata u FBiH, nije bilo značajnijih aktivnosti tako da u toku 2021. godine nije izrađena Strategije razvoja za period 2021-2027.

Skupština USK je na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj 19.05.2021. godine usvojila Strategiju razvoja USK za period 2021. – 2027., čime su otklonjene sve zakonske prepreke za usvajanje navedenog strateškog dokumenta kao lokalnog odnosno gradskog u skladu sa članom 20., stav 5. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17). Nakon usvajanja ove Strategije od strane Gradskog vijeća, pristupiće se procesu konsultacija izrade Trogodišnjeg plana implementacije za period 2022. – 2024. na način da će se definirati konkretni projekti i mjere u skladu sa strateškim ciljevima definiranim u Strategiji razvoja USK, čime će se završiti cjelokupan proces i ciklus razvojnog planiranja na lokalnom nivou, a koji će biti u skladu sa postojećom zakonskom regulativom (Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, Uredba o izradi strateških

---

<sup>1</sup> Srednjoročna evaluacija se organizuje u sklopu priprema za predstojeću reviziju lokalne razvoje strategije. Podršku provođenju neovisne evaluacije pruža UNDP-ov „Projekat integriranog planiranja lokalnog razvoja“ (ILDLP), kao zajednička inicijativa Vlade Švicarske i UNDP-a. U tu svrhu, Projekat ILDP je angažirao vanjskog/u evaluatoricu/a.

dokumenata u Federaciji BiH, Uredba o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH). Nakon završetka procesa konsultacija dokument će biti upućen Gradskom vijeću na usvajanje.

Posljedica svega gore navedenog jeste da u 2021. godini Općina Bosanska Krupa nije imala važeću Strategiju razvoja. Shodno tome, nije rađen ni trogodišnji plan implementacije za period 2021-2023. godina.

Ovaj izvještaj pripremila je Služba za upravljanje razvojem na osnovu Izvještaja o radu organizacionih jedinica za 2021. godinu. Prikazali smo strateške projekte koji su planirani Planom implementacije 2020-2022 (1+2) te planovima organizacionih jedinica za 2021. godinu i isti ili slični projekti naći će se kao mjere u novom izdanju Strategije razvoja. Stepenn realizacije rađen je na osnovu planova i izvještaja organizacionih jedinica.

## 2. STRATEŠKI CILJEVI

### 2.1. STRATEŠKI CILJEVI STRATEGIJE RAZVOJA UNSKO-SANSKOG KANTONA 2021-2027

Strateški ciljevi Strategije razvoja USK-a su zasnovani na strateškim pravcima i definisani u skladu sa postavljenom vizijom razvoja. Preporučuju se sljedeći strateški ciljevi

STRATEŠKI CILJ 1	Izgrađeni privredni kapaciteti uz održivo korištenje prirodnih resursa
STRATEŠKI CILJ 2	Unaprijeđen razvoj inkluzivnog i prosperitetnog društvenog sektor
STRATEŠKI CILJ 3	Održivo upravljanje okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima

**Prvi strateški cilj** zasnovan je na nekoliko ključnih pretpostavki:

- da se raspoloživi prirodni resursi (prvenstveno oni za razvoj poljoprivrede, turizma i prerađivačke industrije) stave u punoj mjeri u funkciju razvoja USK;
- da se prirodni resursi koriste na održiv način i da postoje privredni subjekti koji bilježe dobre rezultate, povećavaju obim poslovanja broj zaposlenih i vrijednost izvoza;
- da se povećaju prihodi i privrednih subjekata i stanovništva, što se ostvaruje kreiranjem proizvoda i usluga zasnovanih na jedinstvenim prirodnim resursima i na znanju, podsticanjem lokalnih i privlačenjem stranih investicija;
- da se kapaciteti i saradnja između subjekata koji su ključni za privredni razvoj USK dalje razvijaju, kako bi se obezbijedili potrebni resursi, uključujući i one ljudske, neophodni za privredni razvoj zasnovan na inovacijama;
- da se uspostavi dinamično tržište rada, a obrazovni sistem uskladi sa potrebama najvažnijih privrednih grana USK;
- da se na optimalan način iskoristi neposredna blizina EU tržišta za protok ljudi, roba, znanja i kapitala;

- da postoje prilike u međunarodnim lancima vrijednosti koje privreda USK može da iskoristi, stvarajući na taj način i bolje uslove života za stanovništvo USK.

**Drugi strateški cilj** je zasnovan na sljedećim ključnim pretpostavkama:

- da se, poštujući komparativne prednosti USK, pristupi strateškom razvoju visokog obrazovanja te zdravstva i socijalne zaštite na ravnomjerno, ravnopravno i dosljedan način za sve građane,
- da se, istovremeno uz razvojne procese, radi istovremeno na razvoju osnovnih principa individualne građanske, političke i službeničke odgovornosti u pogledu pružanja javnih usluga na svim nivoima vlasti,
- međusobno nadopunjavanje gradova i komplementarnost u ekonomskom, obrazovnom, kulturnom i drugom domenu,
- ostvarivanje zajedničkih projekata između naselja, posebice u upravljanju lokalnim saobraćajem, detaljnom uređenju prostora, očuvanju kulturnog i prirodnog naslijeđa
- kontrola fizičkog širenja gradova i naselja.

**Treći strateški cilj** je zasnovan na sljedećim pretpostavkama:

- da se obrati pažnja na sprečavanje opterećivanja i zagađivanja okoliša, kao i poboljšanje i obnovu svih prirodnih resursa;
- čuvanje i zaštitu prirodnih resursa, racionalno korištenje resursa i takav način ekonomskog razvoja kojim se može osigurati obnova resursa;
- prekogranična i međunarodnu saradnju u zaštiti okoliša;
- koordiniranje ekonomskog razvoja i integriranje društvenog i ekonomskog razvoja u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša i postojećim resursima;
- dinamičan infrastrukturni razvoj i izgradnji USK, zasnovan na Prostornom plan USK, uključujući uspostavu i razvoj institucija za upravljanje okolišem;
- racionalno i ekonomično upravljanje urbanim ekosistemima (voda, energija, otpad),
- smanjenje negativnih uticaja u područjima koja trpe pritisak od strane saobraćaja, kroz primjenu ekološki prihvatljivih saobraćajnih sredstava.
- uvođenje mjera zaštite i prepoznavanje područja koja trebaju zaštitu,
- prepoznavanje prirodnog i kulturnog naslijeđa, kao važnih ekonomskih faktora, te preduslova za razvoj turizma;
- stvaranje veza i koridora između zaštićenih područja, u cilju nesmetanog protoka i genetske razmjene flore i faune;
- korištenje prostora u kontekstu napretka zaštićenih područja, a ne njihove izolacije;
- donošenje strategija upravljanja zaštićenim područjima, uz intenzivno uključivanje ljudi koji nastanjuju te prostore u procese izrade i odlučivanja;
- inkorporacija zaštićenih i ugroženih područja;
- nužnost povezivanja politika upravljanja površinskih i podzemnih voda sa politikama prostornog razvoja.

## 2.2. STRATEŠKI CILJEVI STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE BOSANSKA KRUPA

Revidiranom Strategijom lokalnog razvoja općine Bosanska Krupa za period 2017-2020. godina, usvojeni su slijedeći strateški ciljevi:

Strateški cilj 1	Generisana veća dodana vrijednost u privredi i poljoprivredi
Strateški cilj 2	Unapređena kvaliteta društvenog života zajednice
Strateški cilj 3	Unaprijeđena kvaliteta komunalnih usluga i održivog upravljanja prirodnim resursima

### 2.2.1. SEKTORSKI CILJEVI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE BOSANSKA KRUPA 2010-2020 (REVIDIRANO IZDANJE)

#### Ekonomski razvoj

- Sektorski cilj 1.1. Poboľšano poslovno okruženje na području općine do 2020.g.
- Sektorski cilj 1.2. Osigurano prilagođavanje znanja i vještina potrebama tržišta rada i lokalnog razvoja do 2020.g.
- Sektorski cilj 1.3. Povećan plasman poljoprivrednih proizvoda na tržište do 2020.g.

#### Društveni razvoj

- Sektorski cilj 1: Smanjeni rizici od katastrofa do 2020.g.
- Sektorski cilj 2: Osiguran pristup inkluzivnom obrazovanju do 2020.g.
- Sektorski cilj 3: Do 2020.g. unaprijeđen ambijent kulturnog i društvenog života mladih

#### Sektor zaštite i unapređenja okoliša


- Sektorski cilj 1: Obezbijeđeno kvalitetno snabdijevanje stanovništva pitkom vodom do 2020.g.
- Sektorski cilj 2: Smanjen negativan uticaj odloženog čvrstog otpada i otpadnih voda na životnu sredinu do 2020.g.

## 3. ZBIRNI PREGLED PRIORITETNIH PROJEKATA I OKVIRA ZA NJIHOVO FINANSIRANJE OBUHVAĆENIH PLANOM ZA 2021. GODINU


Za 2021. godinu Planom implementacije i planovima službi predviđena su 24 projekta od kojih pet u sektoru ekonomskog razvoja, devet u sektoru društvenog razvoja i deset projekata u sektoru zaštite okoliša. Za finansiranje ovih projekata za 2021. godinu je planirano ukupno 1.314.847 KM, od čega iz općinskog budžeta 989.939 KM, a iz ostalih izvora 324.908 KM. Na realizaciju projekata u 2021. godini je utrošeno ukupno 2.058.507 KM, od čega je iz budžeta

izdvojeno 609.943 KM (25%), a iz ostalih izvora 1.448.564 KM (75%). U cijelosti ili djelimično realiziranih programa je 16, od toga 5 djelimično realiziranih i 11 u cijelosti.

Grafički prikaz finansiranja projekata iz 2021. godine obuhvaćenih Planom implementacije 2020-2022. godinu i Planovima organizacionih jedinica:

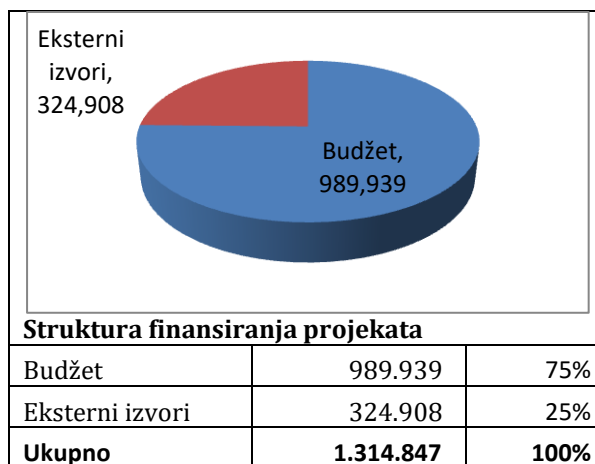


U sljedećim tabelama i grafovima prikazana je struktura planiranih projekata po sektorima za 2021. godinu:

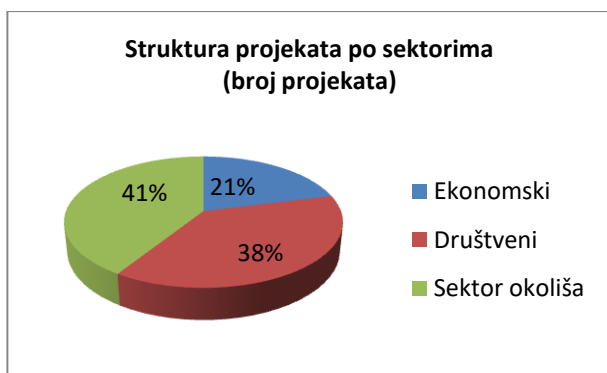

Sektor	Broj projekata	Postotak
Ekonomski	5	21%
Društveni	9	38%
Sektor okoliša	10	41%
<b>Ukupno</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>



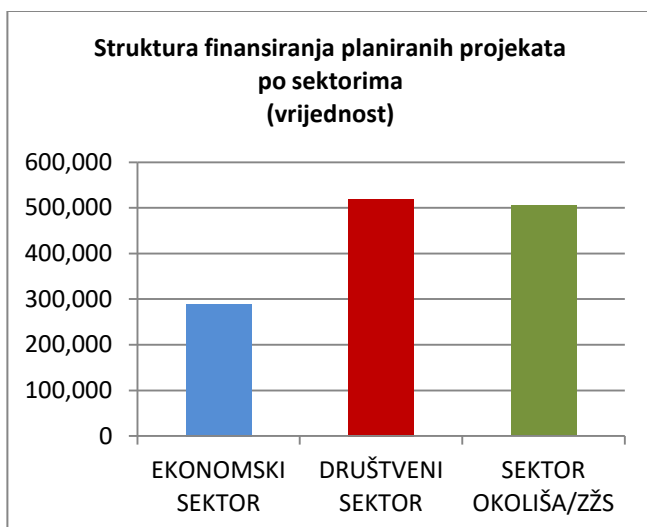

Ekonomski	290.000	21%
Društveni	519.534	41%
Okoliš/Zžs	505.313	38%
<b>Ukupno</b>	<b>1.314.847</b>	<b>100%</b>

### 3.1. PROJEKTI I AKTIVNOSTI

Što se tiče strateških projekata, Planom implementacije Strategije razvoja općine Bosanska Krupa (1+2) za period 2020-2022. godina i planovima službi planirana su ukupno 24 projekta, od toga u sektoru ekonomskog razvoja za 2021. godinu planirano je 5 projekata, u sektoru društvenog razvoja 9 projekata a u sektoru zaštite okoliša 10 projekata. Radi se o projektima koji se protežu kroz više godina, u fazama, kao i novim projektima koji doprinose ostvarenju postavljenih sektorskih ciljeva, poboljšanju poslovnog okruženja, povećanju plasmana poljoprivrednih proizvoda na tržište, zaštite životne sredine.

Na osnovu planova organizacionih jedinica, za realizaciju ovih projekata planirana su ukupna sredstva **1.314.847 KM**, od toga iz **Budžeta JLS 989.939 KM** a iz **eksternih izvora 324.908 KM**.

**Ukupan procenat finansijske realizacije projekata u izvještajnoj godini je 157%. Za realizaciju 16 projekata od planiranih 24 utrošeno je 30% iz Budžeta Općine i 70% iz ostalih izvora od ukupne realiziranih sredstava.**

Tabela 1. Pregled planiranih naspram ostvarenih projekata u 2021. godini (svi sektori)

PREGLED (potpuno ili djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	24	1.314.847	989.939	324.908
% struktura finansiranja od A		100	75	25

U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.	16	2.058.507	609.943	1.448.564
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)		157	46	110
% struktura (od B)		100	30	70
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	5	71.000	71.000	0
% djelimično realiziranih projekata (od A)		5	5	0
% struktura (od C)		100	100	0
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	11	1.987.507	538.943	1.448.564
% u cijelosti završenih projekata (od A)		151	41	110
% struktura (od D)		100	27	73

Tabela 2. Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima na osnovu Plana implementacije

	Oblast	Zbir finansijskih vrednosti projekata		Struktura finansiranja realizovanih projekata			
		Planirano	Realizovano	Budžet	(%)	Ostalo	(%)
2021	Društveni razvoj	519.534	1.389.618	96.872	7	1.292.746	93
	Ekonomski razvoj	290.000	305.715	286.209	93	19.506	7
	Sektor okoliša	505.313	363.174	226.862	62	136.312	38
	Ukupno	1.314.847	2.058.507	609.943	30	1.448.564	70
	% po planu implementacije		157%				

**U okviru ekonomskog sektora** u toku 2021. godine planirano je pet projekata od kojih je jedan realiziran i jedan je u toku a za tri nije bilo aktivnosti. U okviru ovog sektora su planirani, odnosno nastavljeni oni započeti projekti koji doprinose ostvarenju postavljenih sektorskih ciljeva, poboljšanju poslovnog okruženja, povećanju plasmana poljoprivrednih proizvoda na tržište. Za realizaciju projekata iz ekonomskog sektora u 2021. godini je planirano 290.000 KM, od čega je iz općinskog budžeta trebalo izdvojiti 290.000 KM (100%), a iz ostalih izvora 0 KM, a utrošeno je 305.715 KM. Od toga iz općinskog budžeta izdvojeno je 286.209 KM (99%) a iz eksternih izvora 19.506 KM (1%), što u odnosu na planirana sredstva iznosi 105%. Stepen realizacije je ovako visok iz razloga što su iz eksternih izvora povučena značajno veća sredstva od planiranih u projektu Podrška poljoprivrednoj proizvodnji. Tokom izvještajnog perioda realiziranu su djelimično ili u potpunosti dva projekta i to: Podrška poljoprivredi (podsticaji) u cijelosti te Podrška privrednim subjektima čija se finalizacija nastavlja i u 2022. godini. Na projektima Integrisana socio-

ekonomska podrška žrtvama mina u BiH i Sufinansiranje Centra za podršku poduzetništvu u okviru projekta Razvoj inovacija i privlačenja investicija nije bilo aktivnosti. Također u projektu Izgradnja infrastrukture poslovnih zona nije bilo aktivnosti, naime projekat „Modernizacija PZ Pilana Plan 500+“ je okončan završetkom 2020. godine, a za Poslovnu zonu Vatreli mlin u 2021. godini nije bilo aktivnosti.

Također, u okviru ovog sektora realizirano je još osam projekata koji nisu bili planirani, i to: Subvencije naknade za korištenje javnih površina za ugostiteljske objekte; Subvencija iznosa redovne kamate poslovnim subjektima; Subvencija komunalne naknade za ugostiteljske objekte; Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva; Izrada glavnog projekta arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u putnom pojasu ul. 511 SBB-e i Trga Alije izetbegovića; Uređenje pješačke staze koja spaja ul. 505. Vitečke brigade i ul. M. Tita – faza I i ugradnja ograde na stepenicama na keju; Adaptacija i sanacija prostorija bivše Una banke i Izgradnja interne saobraćajnice – Trasa 8 u PZ Pilana. Ukupna realizacija ovih projekata je: 1.312.447 KM, od toga iz Budžeta JLS 631.387 i iz eksternih izvora 681.060. Kako nisu bili planirani ovi projekti nisu prikazani u stepenu realizacije plana.

Tabela 3. - Ekonomski razvoj

PREGLED (potpuno ili djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
<b>PLANIRANO</b>				
A. Ukupan broj planiranih projekata	5	290.000	290.000	0
% struktura finansiranja od A		100	100	0
<b>U REALIZACIJI</b>				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.	2	305.715	286.209	19.506
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)		105	99	7
% struktura (od B)		100	94	6
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	1	71.000	71.000	0
% djelimično realiziranih projekata (od A)		24	24	0
% struktura (od C)		100	100	0
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	1	234.715	215.209	19.506
% u cijelosti završenih projekata (od A)		81	74	7
% struktura (od D)		100	92	8

**U društvenom sektoru** je planirano devet projekata ukupne vrijednosti 519.534 KM, i to 284.126 KM (55%) planirano iz općinskog budžeta, a 235.408 KM (45%) iz ostalih izvora. Za realizaciju projekata je utrošeno 1.389.618 KM i to 96.872 KM (7%) iz budžeta općine i 1.292.746 KM (93%) iz eksternih izvora, što iznosi 267% od planiranih sredstava. Stepenn realizacije je ovako visok iz razloga što su iz eksternih izvora povučena značajno veća sredstva od planiranih u

projektu Deminiranje površina od zaostalih mina. Od planiranih devet realizirano je ili je u toku realizacije osam projekata (Materijalno opremanje strukruta CZ – nabavka ronilačke opreme; Deminirano 557.700,00 m<sup>2</sup> u vrijednost provedenih radova cca 1.115.400,00 KM (1m<sup>2</sup>x2,00KM), i to: MSP Drenova Glavica, SI -3 Vijenac, ID 48 površine 351.900,00 m<sup>2</sup>; M14.1 dionica Grmuša-Mali Radić, ID 14297 površine 205.800,00 m<sup>2</sup>; Čišćenje i Produbljivanje voda II kategorije; Omladinska banka u okviru koje je podržan 31 projekt kroz dva javna poziva; Subvencije određenih kategorija za snabdijevanje vodom – MEG gdje su odlukom koje se odvija planiranom dinamikom; Imenovan radni tim za izradu Strategije za mlade; Sanacija sanitarnog čvora u Prvoj osnovnoj školi i Uređenje i zaštita Starog grada u Bosanskoj Krupi i postavljanje video nadzora). Nije bilo aktivnosti na projektu Izgradnja vatrogasnog doma.

Također, u okviru ovog sektora realizirana je faza projekta Završetak objekta zgrade Gimnazije, koji je uvršten u Program kapitalnih investicija 2020-2024, ali se ne nalazi u Planu implementacije strategije razvoja za 2020-22. godinu. Ukupna realizacija u ovoj fazi je 267.955 KM od toga iz Budžeta JLS 134.526 KM a iz eksternih izvora 133.429 KM. Važno je napomenuti da su učenici nakon više od deset godina podstanarstva ponovo ušli u svoju zgradu i otpočeli sa nastavom, iako je drugi sprat zgrade ostao nedovršen. Ovaj projekat nije uvršten u stepen realizacije jer nije planiran Planom implementacije strategije 2020-2022.

Tabela 4. - Društveni razvoj

PREGLED (potpuno ili djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
<b>PLANIRANO</b>				
A. Ukupan broj planiranih projekata	9	519.534	284.126	235.408
% struktura finansiranja od A		100	55	45
<b>U REALIZACIJI</b>				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.	8	1.389.618	96.872	1.292.746
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)		267	19	249
% struktura (od B)		100	7	93
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	1	0	0	0
% djelimično realiziranih projekata (od A)		0	0	0
% struktura (od C)		100	0	0
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	7	1.389.618	96.872	1.292.746
% u cijelosti završenih projekata (od A)		267	19	249
% struktura (od D)		100	7	93

**U sektoru zaštite okoliša** je planirano deset projekata. Za realizaciju ovih projekata je predviđeno 505.313 KM, od toga iz općinskog budžeta 415.813 KM (82%), a 89.500 KM (18%) iz ostalih izvora. Za realizaciju ovih projekata utrošeno je 363.174 KM, od čega 226.862 KM (62%) iz

budžeta općine i 136.312 KM (38%) iz drugih izvora, te je stepen realizacije 72% od planiranog. Od ukupnog broja planiranih projekata u ovom sektoru, šest je realizirano djelimično ili u potpunosti (Izgradnja nove primarne vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukcija i sanacija postojeće prema planu JKP-a kroz koji se prožimaju tri strateška projekta a u okviru kojeg su izvedene nove instalacije vodovoda i rekonstruisana postojeća mreža /Perna-Ćojluk, Begići, Prokop, Vranjska-Zloimenjak, Vrelo-Vranjska, kanalizacija Prvomajska/; Regulacija potoka Kalender faza XV i Faza XVI; Potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije za Jamu grobnicu; Zaštita od erozije Zelenih otoka u Bosanskoj Krupi ADA 6, 7 i 8; Sanirano klizište „Kosa“ na saobraćajnici u Jezerskom i u toku je tenderska procedura u projektu Zamjena postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete LED svjetiljkama - I Faza). Projekti na kojima nije bilo aktivnosti su Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u MZ Jezerski, Mahmić Selo i Pištaline, Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u podgrmečkim selima i Fazna izgradnja kanalizacionog sistema u Bosanskoj Krupi i Otoci su u stvari obuhvaćeni realiziranim projektom Izgradnja nove primarne vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukcija i sanacija postojeće prema planu JKP-a, tako da se ne može reći da nije bilo realizacije na istima. Jedino na projektu Održivo upravljanje otpadom nije bilo aktivnosti u 2021. godini.

Također, u okviru sektora okoliša realizirani su i projekti Rekonstrukcija ul. Prvomajska – Fekala kanalizacija – Kolektor N1 sredstvima Budžeta JLS i UNDP-a, te projekat Izgradnja nove javne rasvjete, koji nisu bili planirani i s toga nisu prikazani u stepenu realizacije plana. Ukupna vrijednost realizacije ovih projekata je 78.204 KM, od toga iz budžeta JLS 62.845 KM i iz eksternih izvora 15.359 KM.

Tabela 5. - Sektor okoliša

PREGLED (potpuno ili djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
<b>PLANIRANO</b>				
A. Ukupan broj planiranih projekata	10	505.313	415.813	89.500
% struktura finansiranja od A		100	82	18
<b>U REALIZACIJI</b>				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.	6	363.174	226.862	136.312
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)		72	45	27
% struktura (od B)		100	62	38
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	3	0	0	0
% djelimično realiziranih projekata (od A)		0	0	0
% struktura (od C)		100	0	0
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	3	363.174	226.862	136.312
% u cijelosti završenih projekata (od A)		72	45	27
% struktura (od D)		100	62	38

Slijedom iznesenog za 2021. godinu planirana su 24 projekta i to su projekti koji su započeti u prethodnim godinama i za koje se uglavnom mogu predvidjeti finansijska sredstva kako iz budžeta općine tako i iz eksternih izvora finansiranja.

U izvještajnom periodu realizirano je ili je u toku realizacije 16 projekata za koje je izdvojeno 2.058.507 KM, od čega iz budžeta općine 609.943 KM (30%), a iz eksternih izvora 1.448.564 KM (70%), dok na osam projekata nije bilo aktivnosti. Finansiranje projekata iz eksternih izvora u 2021. godinu, je većim dijelom bilo iz fondova EU, javnih preduzeća i viših nivoa vlasti.

Pored ovih projekata, realizirano je i 11 projekata koji nisu bili planirani planovima službi niti Planom implementacije strategije 2020-2022 a koji doprinose realizaciji strateških i sektorskih ciljeva. Ovi projekti nisu uvršteni u stepen realizacije strategije ali je važno napomenuti da su isti realizirani. Sredstva za njihovu realizaciju u okviru Budžeta su obezbijeđena rebalansom ili prestrukturiranjem budžetskih linija te sredstvima viših nivoa vlasti i stranih donatora. Neki od ovih projekata kao npr. razne subvencije su usmjereni ka privrednim subjektima u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije korona virusa (Subvencije naknade za korištenje javnih površina ugostiteljskih objekata; Subvencije iznosa redovne kamate poslovnim subjektima; Subvencije komunalne naknade za ugostiteljske objekte), zatim Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva (17 projekata) za koje je izdvojeno 905.502 KM, Završetak objekta zgrade Gimnazije čijom realizacijom su se učenici i profesori nakon više od deset godina podstanarstva konačno vratili u matičnu zgradu, Rekonstrukcija u ul. Prvomajska – Kolektor N1 (sredstva JLS i UNDP), Izgradnja interne saobraćajnice Trasa u PZ Pilana, Izgradnja nove rasvjete, Uređenje pješačkih staza te Izrada glavnog projekta arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u putnom pojasu u ul. 511. Sbb i Trga Alije Izetbegovića koje direktno utiču na turističku ponudu grada. Za realizaciju ovih projekata izdvojeno je 1.363.729 KM, od toga iz Budžeta JLS 682.669 KM a iz eksternih izvora 681.060 KM.

## 4. MAKROINDIKATORI

Ključni makroekonomski indikatori za period 2019. – 2021. prikazani su u slijedećoj tabeli:

INDIKATOR		2019.	2020.	2021.
STANOVNIŠTVO (PROCJENA)		24.804	24.587	24.295
RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO		17.413 (71,4%)	17.209 (70%)	17.015 (70%)
STEPEN ZAPOSLENOSTI		3.378 (19,4%)	3.300 (19,2%)	3.503 (20,6%)
STEPEN NEZAPOSLENOSTI		3.434 (51,5%)	3.438 (51,0%)	3.186 (47,6%)
NEZAPOSLENOST PREMA STEPENU STRUČNOG OBRAZOVANJA	VSS	189	179	150
	VŠS	37	31	25
	SSS	885	841	776
	NSS	10	11	11
	VKV	9	6	6
	KV	908	883	801
	PKV	109	104	94
	NKV	1.445	1.383	1.322
UKUPNO		3.434	3.438	3.186
PROSJEČNA NETO PLAĆA		865 KM	883 KM	902
PROSJEČNA PENZIJA		374,59 KM	387,01 KM	389,10
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA		UVOZ- 42.309.034 KM IZVOZ- 66.360.087 KM	UVOZ- 43.016.429 KM IZVOZ- 56.032.732 KM	UVOZ- 71.506.304 KM IZVOZ- 95.489.941 KM
PORESKI PRIHODI		2.344.324 (po glavi stanovnika 95 KM)	2.607.472 (po glavi stanovnika 106 KM)	3.158.639 (po glavi stanovnika 130 KM)
BROJ UČENIKA (SREDNJE ŠKOLE)		524	478	440
BROJ UČENIKA (OSNOVNE ŠKOLE)		1.970	1.835	1.700
STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA	<i>pravna lica</i>	476	480	493
	<i>podružnice</i>	342	344	344
	<i>obrtnici</i>	304	314	313
	<i>Ukupno</i>	1.122	1.138	1.150

Izvor podataka: službena stranica Federalnog zavoda za programiranje:  
<https://fzzpr.gov.ba/bh/publikacije/socioekonomski-pokazatelji-po-opcinama>

## Tabelarni pregled stanja realizacije strateških projekata u 2021. godini

### Sektor ekonomskog razvoja

SC	Projekat	Status	Opis	Plan 2021 (iz planova službi)	Izvršenje Budžet	Izvršenje eksterni	Ukupno izvršenje 2021	Veza sa Budžetom/izvor finansiranja	Zadužena služba
SC1/SEC1.1	1.1.1.1. Projekat: Izgradnja infrastrukture poslovnih zona (2017-2020)	nije bilo aktivnosti	PZ Pilana završena 2020.; PZ Vatreli mlin nije bilo aktivnosti	0	0	0	0	615311 SKSPI/ SUR	SKSPI, SUR
SC1/SEC1.1	1.1.1.2. Projekat: "Razvoj inovacija i privlačenja investicija-BINOVA" - II faza (2017-2019) Sufinansiranje Centra za podršku poduzetništvu	nije bilo aktivnosti	Rebalansom sredstva preusmjerena na druge projekte	30.000	0	0	0	614329- Sufinansiranje Centra za podršku poduzetništvu	SUR
SC1/SEC1.1	1.1.1.5. Program poticaja obrtima i srodnim djelatnostima - <i>Podrška privrednim subjektima</i>	U toku	Planirana sredstva u Budžetu 50.000 KM, prestrukturiranjem povećan iznos na 74.000 KM. Objavljena dva javna poziva za podršku razvoju turizma, odabrani korisnici, sredstva uplaćena. Podržano ukupno šest korisnika.	80.000	71.000	0	71.000	615311-JLS	SUR
SC1/SEC1.3	1.3.1.1. Program podrške razvoju poljoprivrede 2021	realiziran	Pravilnik o vrsti, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na novčane podrške u poljoprivredi za 2021. godinu je pripremljen i usvojen od strane općinskog vijeća, zaprimljeni su zahtjevi korisnika. Zahtjevi korisnika za kantonalne i federalne novčane podrške su obrađeni u skladu sa propisima kantona i federacije 19.505,83 KM-Jesenja sjetva 2020. godine, FM Ministarstvo poljoprivrede. Realizovano u 2021. godini	170.000	215.209	19.506	234.715	614515-Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji Budžet općine; Sredstva iz Budžeta USK i Budžeta FBiH	SRPO



SC1/SEC1.3	1.3.1.3. Projekat ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica	nije bilo aktivnosti	Nije bilo javnih poziva	10.000	0	0	0	615311-Podrška projektima i sredstva donatora (EU fond)	SCZ
	<b>UKUPNO</b>			<b>290.000</b>	<b>286.209</b>	<b>19.506</b>	<b>305.715</b>		

### Sektor društvenog razvoja

SC	Projekat	Status	Opis	Plan 2021 (iz planova službi)	Izvršenje Budžet	Izvršenje eksterni	Ukupno izvršenje 2021	Veza sa Budžetom/izvor finansiranja	Zadužena služba
SC2/SEC2.1	2.1.1.1. Projekat: Izgradnja Vatrogasnog doma Profesionalne vatrogasne jedinice	nije bilo aktivnosti	Nije bilo aktivnosti	15.000	0	0	0	621100-nabavka projektne dokumentacije	SCZ -I faza izrada projektne dokumentacije i pribavljanje nekretnine
SC2/SEC2.1	2.1.1.2. Projekat: Materijalno opremanje struktura CZ (službi i jedinica opće namjene) (2019-2020)	realiziran	Izvršena je nabavka planirane opreme Službi za spašavanje na vodi i pod vodom i to: 1.Kompenzator plovnosti BCD Seac RENTAL KIT CLUB- 2 komada; 2.Ronilačka lampa R15 - 2 komada; 3.Suho ronilačko odijelo-1 komad. Ukupna vrijednost opreme s PDV-om: 6.915,90 KM	45.500	6.916	0	6.916	614239 Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda	SCZ

SC2/SEC2.1	2.1.2.1 Projekat: Čišćenje i produbljivanje voda II kategorije (2017-2020) <i>Regulacija dijela potoka Voloder sa izgradnjom fekalnog kolektora u Bos. Otoci – Faza I</i>	realiziran	Budžet JLS, USK	87055	37.052	50.000	87.052	614239 naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	SKSPI i SCZ
SC2/SEC2.1	2.1.2.2. Projekat: Deminiranje površina od zaostalih mina (2017-2020)	realiziran	Ukupno oslobođeno sumnjive površine (deminirano) u 2021.godini 557.700,00 m2 u vrijednost provedenih radova cca 1.115.400,00 KM (1m2x2,00KM): 1. MSP Drenova Glavica , SI -3 Vjenac, ID 48 površine 351.900,00m2, 10.05.2021.godine, izvođač radova deminerski bataljon OSBiH; 2. M14.1 dionica Grmuša-Mali Radić, ID 14297 površine 205.800,00m2, 18.05.2021.godine, izvođač radova deminerski timovi FUCZ	180.000	0	1.115.400	1.115.400	614311-Grant za deminiranje; Donatorska sredstva	SCZ
SC2/SEC2.3	2.3.1.1. Projekat: Izrada Politika za mlade (2017-2018) - <i>Izrada strategije za mlade</i>	u toku	U decembru 2021.godine pripremljena i donešena Odluka o pristupanju izrade Strategije prema mladima za period 2022 – 2027, te je na osnovu iste imenovan radni tim čiji je koordinator Stručni saradnik za rad s mladima I nevladinim organizacijama.	10.000	0	0	0	JLS/KULT	SOPDD
SC2/SEC2.3	2.3.1.2. Projekat: Omladinska banka (2019-2020)	realiziran	Kroz dva Javna poziva Omladinske banke Bosanska Krupa za podršku projektima neformalnih grupa mladih ukupno je odobren 31 projekt. Ukupna vrijednost projekata je 45.957,35 KM, od kojih je Općina Bosanska Krupa izdvojila 15.865,47 KM, a Fondacija Mozaik 12.134,88 KM, dok je doprinos neformalnih grupa iznosio 17.957,00 KM, broj volontera: 562, broj volonterskih sati: 5263, ukupan broj korisnika: 3205. Nije bilo podržanih mikrobiznisa, niti na jednom javnom pozivu nije bilo pristiglih prijava	37.000	15.865	30.092	45.957	614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Omladinska Banka	SOPDD

SC1.,2., i 3.	Projekat ekonomskog i okolišnog upravljanja - MEG Subvencije JKP	realiziran	Odluka se provodi, planirana sredstva 10.000 KM rebalansom smanjena na 5.000 KM	10.000	2.796	0	2.796	614239 - Subvencija JKP 10.juli- projekat MEG	SUR, SOPDD, JKP, CSR
SC	Sanacija sanitarnog čvora- Prva OŠ Bosanska Krupa	realiziran	Bugarska Vlada 36.803 KM a JLS 9.900 KM	40.103	9.900	36.803	46.703	615311	SKSPI
SC	Uređenje i zaštita Starog grada u Bos.Krupi i postavljanje video nadzora	realiziran	Popravka oštećenih dijelova zidina Starog grada i uređenje površina za korištenje i postavljanje videonadzora	94.876	24.343	60.451	84.794	615311	SKSPI
	<b>UKUPNO</b>			<b>519.534</b>	<b>96.872</b>	<b>1.292.746</b>	<b>1.389.618</b>		

#### Sektor zaštite okoliša

SC	Projekat	Status	Opis	Plan 2021 (iz planova službi)	Izvršenje Budžet	Izvršenje eksterni	Ukupno izvršenje 2021	Veza sa Budžetom/izvor finansiranja	Zadužena služba
SC3/SEC3.1	3.1.1.1.Projekat: Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u MZ Jezerski, Mahmić Selo i Pištaline (2017-2020)	nije bilo aktivnosti	vidi 3.1.1.4	0	0	0	0	615311 Budžet općine/Vodne naknade	SKSPI
SC3/SEC3.1	3.1.1.2.Projekat: Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u podgrmečkim selima (2017-2020)	nije bilo aktivnosti	vidi 3.1.1.4	0	0	0	0	615311 Budžet općine	SKSPI


SC3/SEC3.1	3.1.1.4. Projekat: Zamjena sekundarne vodovodne mreže u Bos.Krupi i Bos.Otoci (2017-2020) <i>Izgradnja nove primarne vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukcija i sanacija postojeće (prema planu JKP-a)</i>	realiziran	Izvedene nove instalacije vodovoda i rekonstruisana postojeća mreža (Perna-Čojluk, Begići, Prokop, Vranjska-Zloimenjak, Vrelo-Vranjska, kanalizacija Prvomajska)	90.000	72.208	40.000	112.208	615311 Budžet/JKP/ME G	SKSPI
SC3/SEC3.2	3.2.1.3. Održivo upravljanje otpadom (MOS) Uređenje deponije Meždre - Vlaški Do	nije bilo aktivnosti		0	0	0	0	615311 - Budžet općine; KM i JKP (B. Krupa, Cazin i Bužim)	SKSPI
SC3/SEC3.2	3.2.2.1. Projekat: Fazna izgradnja kanalizacionog sistema u Bosanskoj Krupi i Otoci (2017-2020)	nije bilo aktivnosti	vidi 3.1.1.4	0	0	0	0	615311 Budžet općine	SKSPI
SC3/SEC3.2	3.2.2.2. Projekat: Regulacija potoka Kalender - faza XV (2017-2021) Regulacija potoka Kalender u ul. Branilaca grada – Faza XVI	realiziran	Regulisan dio potoka Kalender: Faza XV plan 135.710 KM JLS, realizirano: Faza XV 84.897 KM (Budžet JLS) Faza XVI 48.402 KM (Budžet JLS 37.090 KM; USK 11.312 KM)	135.710	121.987	11.312	133.299	615 311 Ekološke naknade i CZ	SKSPI
SC3/SEC3.2.	Jama grobnica	u toku	Potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije.	7.000	0	0	0	821521 Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja - Izrada projektne dokumentacije - Jama grobnica	SKSPI
SC3/SEC3.4	Projekat zaštite od erozije "Zelenih otoka" - Male ade Bos. Krupa <i>Zaštita od erozije Zelenih otoka u Bosanskoj Krupi ADA 6, 7 i 8</i>	u toku	U toku rješavanje imovinsko-pravnih poslova	111.900	0	0	0	615311 Fond za zaštitu okoliša, Budžet općine	SKSPI

SC3/SEC3.4	Sanacija klizišta Kosa	realiziran	Sanirano klizište na saobraćajnici u Jezerskom	85.000	32.667	85.000	117.667	615311	SKSPI
SC3	Zamjena postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete LED svjetiljkama - I Faza	U toku	U toku tenderska procedura	75.703	0	0	0	821221	SKSPI
	<b>UKUPNO</b>			<b>505.313</b>	<b>226.862</b>	<b>136.312</b>	<b>363.174</b>		


### Tabelarni pregled projekata koji su realizirani u 2021. godini a nisu bili planirani

R/br	Projekat	Status	Opis	Izvršenje Budžet	Izvršenje eksterni	Ukupno izvršenje 2021	Nadležna služba	Sektor
1.	Subvencije naknade za korištenje javnih površina za ugostiteljske objekte	realiziran	Rješenja se rade po službenoj dužnosti Nije bilo planirano budžetom - prestrukturiranje 20.000 KM	23.148	0	23.148	SKSPI	ES
2.	Subvencija iznosa redovne kamate poslovnim subjektima	realiziran	Za dva privredna subjekta subvencionira se kamata na mjesečnom nivou u trajanju dvije godine (plan 1.200 KM, prestrukturiranje 1.162 KM)	1.162	0	1.162	SRPO	ES
3.	Subvencija komunalne naknade za ugostiteljske objekte	realiziran	Rješenja se rade po službenoj dužnosti Nije bilo planirano budžetom - prestrukturiranje 27.000 KM	26.680	0	26.680	SUR/SRPO	ES

4.	Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva	realiziran	Ukupno 17 projekata u više mjesnih zajednica	373.230	532.272	905.502	SKSPI	ES
5.	Završetak objekta zgrade Gimnazije	realiziran	Zanatski radovi prizemlje i sprat (Budžet JLS i USK)	134.526	133.429	267.955	SKSPI	DS
6.	Izrada glavnog projekta arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u putnom pojasu ul. 511 SBB-e i Trga Alije izetbegovića u Bos. Krupi	realiziran		17.853	0	17.853	SKSPI	ES
7.	Rekonstrukcija ul. Prvomajska – Fek. kanalizacija – Kolektor N1	realiziran	Budžet JLS, UNDP	11.563	15.359	26.922	SKSPI	SO
8.	Uređenje pješačke staze koja spaja ul. 505. Vitečke brigade i ul. M. Tita – faza I i ugradnja ograde na stepenicama na keju.	realiziran		5.538	0	5.538	SKSPI	ES
9.	Adaptacija i sanacija prostorija bivše Una banke u Bos. Krupi	realiziran		6.868	0	6.868	SKSPI	ES
10.	Izgradnja interne saobraćajnice – Trasa 8 u PZ Pilana	realiziran		30.819	0	30.819	SKSPI	ES
11.	Izgradnja nove javne rasvjete	realiziran		51.282	0	51.282	SKSPI	SO
	<b>UKUPNO:</b>			<b>682.669</b>	<b>681.060</b>	<b>1.363.729</b>		

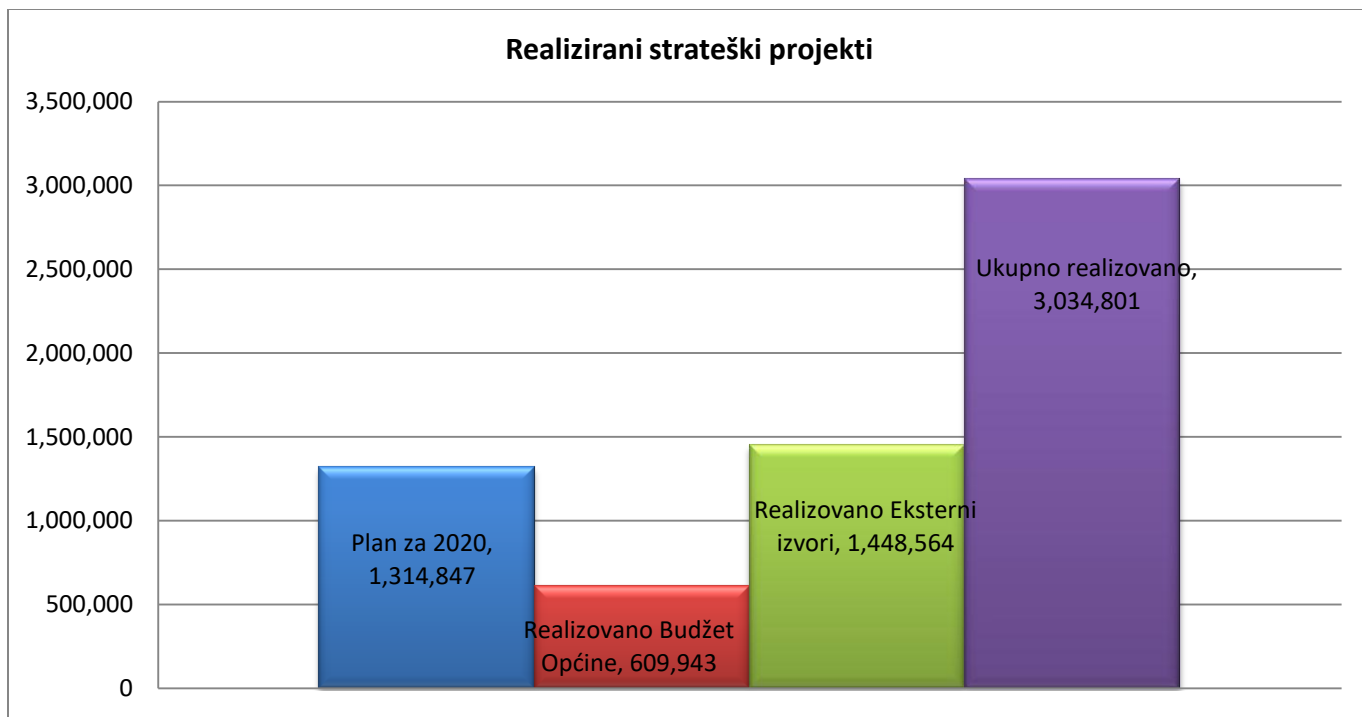


**Graf 1. Realizacija strateških projekata prema izvorima finansiranja**

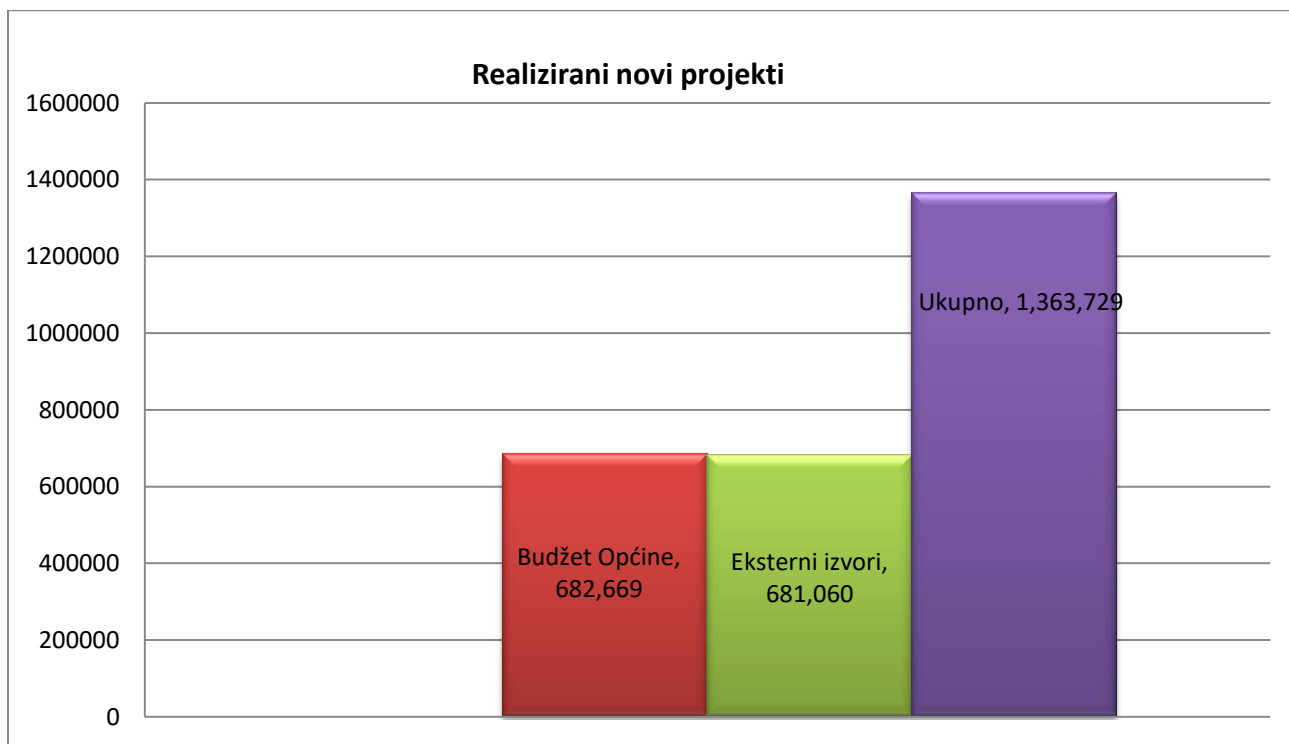

**Graf 2. Projekti koji su realizirani u 2021. godini a nisu planirani Planom implementacije 2020-2022 ili planovima službi**

### Realizacija projekata

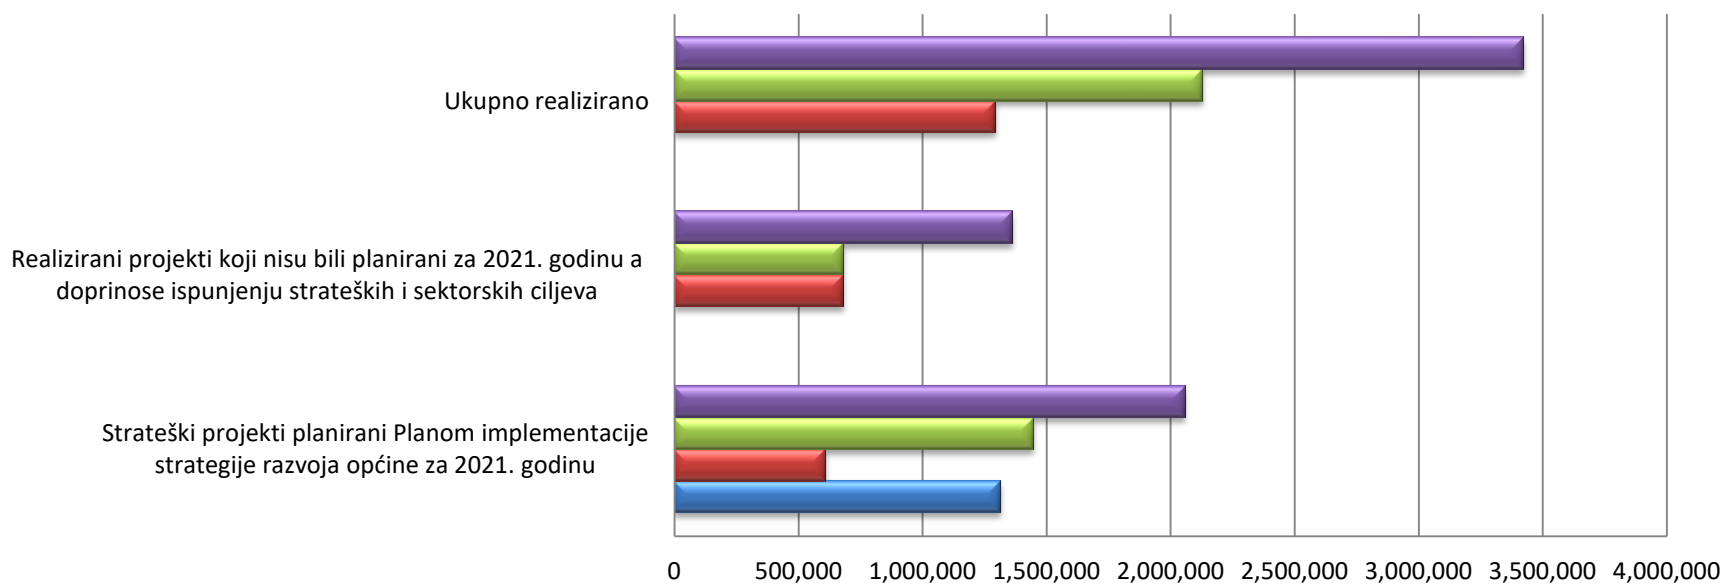

	Strateški projekti planirani Planom implementacije strategije razvoja općine za 2021. godinu	Realizirani projekti koji nisu bili planirani za 2021. godinu a doprinose ispunjenju strateških i sektorskih ciljeva	Ukupno realizirano
Ukupno	2,058,507	1,363,729	3,422,236
Realizovano iz eksternih izvora	1,448,564	681,060	2,129,624
Realizovano iz Budžeta Općine	609,943	682,669	1,292,612
Plan za 2021	1,314,847	0	0

Graf 3. Realizirani projekti



## Zaključak:

Općina Bosanska Krupa u 2021. godini našla se u situaciji da je Strategija razvoja općine Bosanska Krupa istekla sa 2020. godinom, a nije usvojena nova, tako da nije rađen ni trogodišnji plan implementacije za period 2021-2023. godina.

Unatoč tome, nastavljene su aktivnosti na realizaciji strateških projekata i projekata koji doprinose ispunjenju strateških i sektorskih ciljeva.

U sjeni pandemije korona virusa COVID-19 radilo se na realizaciji projekata sa ograničenim sredstvima uz Budžeta JLS i smanjenim prilivom sredstava iz eksternih izvora.

Općina Bosanska Krupa je i u 2021. godini nastavila sa projektima u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije korona virusa COVID-19. Prioritet je bio podržati postojeća mala i srednja preduzeća i samostalne poduzetnike i zadržati radna mjesta, te pomoći poljoprivrednim proizvođačima i stanovnicima naše općine da kroz zasijane dodatne količine primarnih poljoprivrednih kultura obezbijede veće količine hrane. Sredstva za ove mjere obezbijedena su na način da su se kroz prestrukturiranje Budžeta sredstva na prioritetne mjere preusmjerila sa drugih projekata i stavki koji su stavljeni na čekanje.

Generalne preporuke su sljedeće:

- proces izrade Strategije razvoja općine Bosanska Krupa za period 2021-2027 okončati do 30.06.2022. godine te uraditi trogodišnji plan za period 2022-2024;
- intenzivirati aktivnosti izradi prostorno-planske dokumentacije s ciljem podrške lokalnom razvoju;
- popuniti ključna radna mjesta u Službi za upravljanje razvojem, Službi za komunalne djelatnosti i Službi za obrt, kao nosiocima razvoja, u skladu sa sistematizacijom, kao i jačati kapacitete ljudskih resursa kroz obuke;
- planirati u budžetu JLS što veći iznos sredstava za podršku projektima kako bi se uz obezbijedena sredstva iz vanjskih izvora omogućio što bolji učinak implementacije planiranih projekata;
- planove službi usklađivati sa budžetom, Strategijom razvoja, Programom kapitalnih investicija, Planom rada Gradonačelnika i Gradskog vijeća;
- kontinuirano jačati internu i eksternu komunikaciju po pitanju implementacije, praćenja i izvještavanja realizacije Strategije; sve službe aktivirati u smislu privlačenja sredstava od drugih izvora (donatora, viših nivoa vlasti i dr.) za realizaciju strateških projekata;
- na redovnim koordinacionim sastancima analizirati konstantna odstupanja u stepenu realizacije budžeta vezan za GPR te na osnovu rezultata, identifikovati mjere na osnovu kojih će planiranje budžeta ili godišnjih planova implementacije Strategije biti realnije;
- kontinuirano raditi na procesu unapređenja administrativnih procedura, pojednostavljenja administrativnih procesa, jačanja transparentnosti i smanjenja birokratskog pristupa radu;
- uspostaviti kvalitetniju saradnju sa eksternim razvojnim akterima, višim nivoima vlasti, razvojnim agencijama i fondovima, bankama i dr. i za takve aktivnosti obezbijediti kapacitete i ljudske resurse unutar uprave;
- razvijati međuopćinsku suradnju kroz pripremu i realizaciju zajedničkih projekata;
- raditi na promociji investicijskih potencijala, te privlačiti nove poduzetnike i investiture;
- kontinuirano jačati saradnju poslovnog sektora sa Službom za upravljanje razvojem i Službom za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo u procesima planiranja i realizacije projekata;
- na godišnjem nivou ažurirati bazu podataka o registriranim NVO- a i UG-a, proaktivna udruženja uključiti u procese razvoja općine;
- jačati kapacitete i saradnju sa mjesnim zajednicama u planiranju i realizaciji projekata.

**Služba za upravljanje razvojem**
