



IZVJEŠTAJ

**o realizaciji strateških i drugih projekata iz ekonomskog sektora
za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine**

Maj, 2020. godine

IZVJEŠTAJ

o realizaciji strateških i drugih projekata iz ekonomskog sektora za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine

1. Uvod

Prema Odluci o osnivanju i djelokrugu Jedininstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa, projekte ekonomskog sektora provode i prate uglavnom tri organizacione jedinice, i to: Služba za upravljanje razvojem; Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo i Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove. Pored toga, nekoliko projekata ekonomskog osnaživanja žrtava mina i njihovih porodica pratila je Služba za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu. Svaka organizaciona jedinica uradila je Plan rada za 2019. godinu, polugodišnji Izvještaj te Izveštaj o radu za 2019. godinu u skladu sa PPVI procedurama. Kako bi se dobio godišnji izvještaj o realizaciji projekata ekonomskog sektora, valjalo je iz pojedinačnih izvještaja ove četiri službe i Izvještaja o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije integriranog razvoja Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu izdvojiti dio koji se odnosi na projekte iz ekonomskog sektora i objediniti ih u jedinstven izvještaj.

2. Sažetak

Planom implementacije Strategije razvoja općine Bosanska Krupa (1+2) za period 2019-2021. godina, u sektoru ekonomskog razvoja za 2019. godinu planirano je 5 projekata, od kojih su 4 realizirana i 1 je u toku, a također je započeta realizacija i jednog projekta čija je implementacija bila prolongirana. Za realizaciju projekata iz ovog sektora je planirano 2.672.611 KM a izdvojeno je 2.436.273 KM što je 91% od planiranog. Sredstva su realizirana iz općinskog budžeta 274.726 KM (11%) a iz eksternih izvora 2.161.547 KM (89%).

3. Sprovedene aktivnosti na realizaciji Godišnjeg programa JOOU

Tokom izvještajnog perioda realizirano je djelimično ili u potpunosti 6 projekata u ekonomskom sektoru, i to: Program podrške poljoprivredi (podsticaji), završetak Projekta "ILO" (Povećanje konkurentnosti radne snage na području općine Bosanska Krupa), nastavak izgradnje infrastrukture poslovne zone "Vatreni mlin" (MEG) u okviru projekta "Izgradnja infrastrukture poslovnih zona", Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH (realizirana su tri podprojekta kojima su privučena eksterna sredstva), Program poticaja obrtima i srodnim djelatnostima (MEG) te u okviru projekta Razvoj inovacija i privlačenja investicija BINOVA (koji je bio prolongiran ali su ipak realizirane određene aktivnosti) postavljen video nadzor, uređen okoliš i izvršena montaža elektroinstalacija.

U toku 2019. godine, pored planiranih projekata, realizirana su i dva dodatna projekta koja doprinose ispunjenju strateških i sektorskih ciljeva, tako da je za realizaciju projekata iz ekonomskog sektora izdvojeno ukupno 2.858.158 KM što u odnosu na planirana sredstva iznosi 107%. Od toga, iz općinskog budžeta je izdvojeno 578.337 KM (20%) te iz eksternih izvora

2.279.821 KM (80%). Radi se o sljedećim projektima: Projekat rekonstrukcije i izgradnje putne infrastrukture u osam mjesnih zajednica na koji je utrošeno 421.885 KM i BFC recertifikacija koja je okončana u 2019. godini i dobiven certifikat.

Tabela 1. - Pregled planiranih i ostvarenih projekata u ekonomskom sektoru u 2019. godini

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	5	2672.611	892.855	1.799.756
% struktura finansiranja od A		100	33	67
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.	6	2.436.273	274.726	2.161.547
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)		91	31	120
% struktura (od B)		100	25	75
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	2	69.817	27.079	42.378
% djelimično realiziranih projekata (od A)		3	3	2
% struktura (od C)		100	11	89
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	4	2.366.456	247.647	2.118.809
% u cijelosti završenih projekata (od A)		89	28	85
% struktura (od D)		100	10	90

Tabela 2. - Tabelarni pregled stanja realizacije strateških projekata u 2019. godini

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem i programom	Projekat /mjera	Status projekta (u toku, završen, prolongiran, otkazan, zaustavljen)	Ostvareni rezultat	Plan 2019	Izvori finansiranja - budžet	Izvori finansiranja - eksterni	ukupno	Sektor
SC1/SEC1.1	1.1.1.1. Projekat: Izgradnja infrastrukture poslovnih zona (2017-2020) PZ Vatrene mlin - MEG;	u toku	KSPI - PZ Vatrene mlin dio ugovora biće realiziran u 2020. 56.861 (JLS 14.123 i 42.738 Eks)	684.475	14.123	42.738	56.861	ES
SC1/SEC1.1	1.1.1.2. Projekat: "Razvoj inovacija i privlačenja investicija- BINOVA" - II faza (2017-2019)	Bio prolongiran, realiziran za 2019	Video nadzor; uređen okoliš, Montaža elektroinstalacija	0	12.956	0	12.956	ES
SC1/SEC1.1	1.1.1.5. Program poticaja obrtima i srodnim djelatnostima	realiziran	Završena procedura za 2018.g. Provedena procedura za Poticaje 2019. Uplaćena I tranša sredstava prema ugovorima.	90.000	62.564	40.000	102.564	ES
SC1/SEC1.2	1.2.1.1. Projekat: Povećanje konkurentnosti radne snage na području općine Bosanska Krupa-ILO (2017-2018)	realiziran	Tehnički kapaciteti MSŠ za edukaciju i prekvalifikaciju zavarivača povećani. Obuku prošlo 56 tavarivača, 46 certificirano a 15 zaposleno.	60.936	71.950	0	71.950	ES
SC1/SEC1.3	1.3.1.1. Program podrške razvoju poljoprivrede (2017-2020)	realiziran	Pravilnik za 2019.g. na općinskom nivou usvojen na OV, raspisani JP-i, zaprimljeni zahtjevi korisnika. Zahtjevi korisnika za kantonalne i federalne novčane podrške su obrađeni u skladu sa propisima kantona i federacije.	1.830.000	82.733	1.876.009	1.958.742	ES
SC1/SEC1.3	1.3.1.3. Projekat ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica Socio-ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica -	realiziran	Projekat I - NVO ASB i JLS (9.600 KM-10%) Projekat II - NVO ASB i JLS (9.000 KM-10%) Projekat III - NVO WORLD	7.200	30.400	202.800	233.200	ES


	(Projekat I i II) i Direktna socio-ekonomska pomoć izuzetno ugroženim porodicama u lokalnim zajedicama u BiH (Projekat III)		VISION i JLS (11.800 KM - 25%)					
				2.672.611	274.726	2.161.547	2.436.273	

Tabela 3. - Projekti koji su realizirani u 2019. godini a nisu planirani Planom implementacije 2019-2021


Veza sa strateškim i sektorskim ciljem i programom	Projekat /mjera	Status projekta (u toku, završen, prolongiran, otkazan, zaustavljen)	Ostvareni rezultat	Plan za 2019	Izvori finansiranja			Sektor
					Budžet Općine	Eksterni izvori	Ukupno	
S.C. 4.	BFC certifikat- Unapređenje poslovnog okruženja i poslovne infrastrukture	novi	Dobiven certifikat, napredak od 87,33%. Nije bilo finansijske realizacije.	0	0	0	0	ES
SC1/SEC1.3	Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalne putne mreže	novi	Realizirano osam projekata u više mjesnih zajednica	0	303.611	118.274	421.885	ES
					303.611	118.274	421.885	

Tabela 4. – Ukupna realizacija u ekonomskom sektoru


	Plan za 2019	Budžet Općine	Eksterni izvori	Ukupno	
Strateški projekti planirani Planom implementacije strategije razvoja općine za 2018. godinu	2.672.611	274.726	2.161.547	2.436.273	
Realizirani projekti koji nisu bili planirani za 2018. godinu a doprinose ispunjenju strateških i sektorskih ciljeva	0	303.611	118.274	421.885	
UKUPNO REALIZIRANO U EKONOMSKOM SEKTORU	2.672.611	578.337	2.279.821	2.858.158	

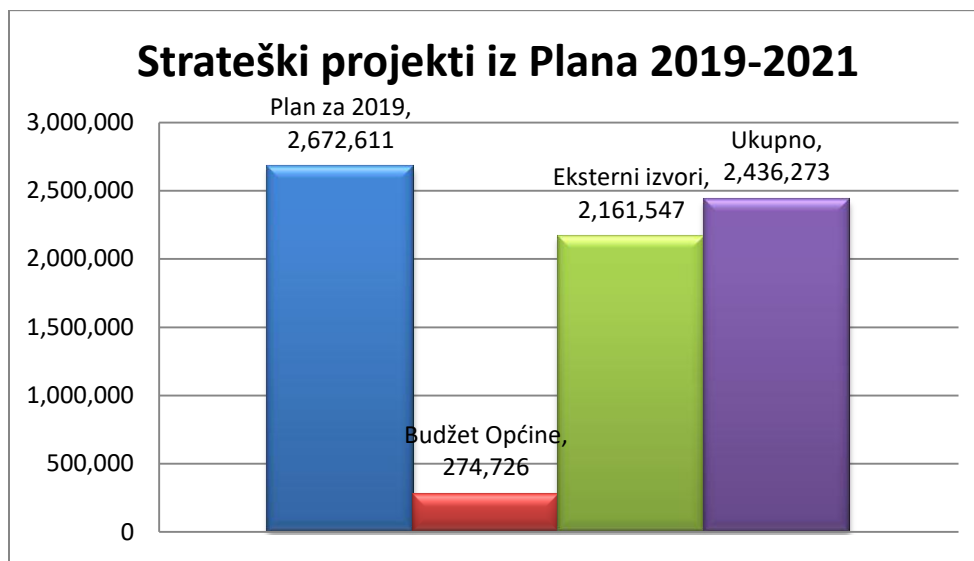

Graf 1. Realizacija strateških projekata prema izvorima financiranja

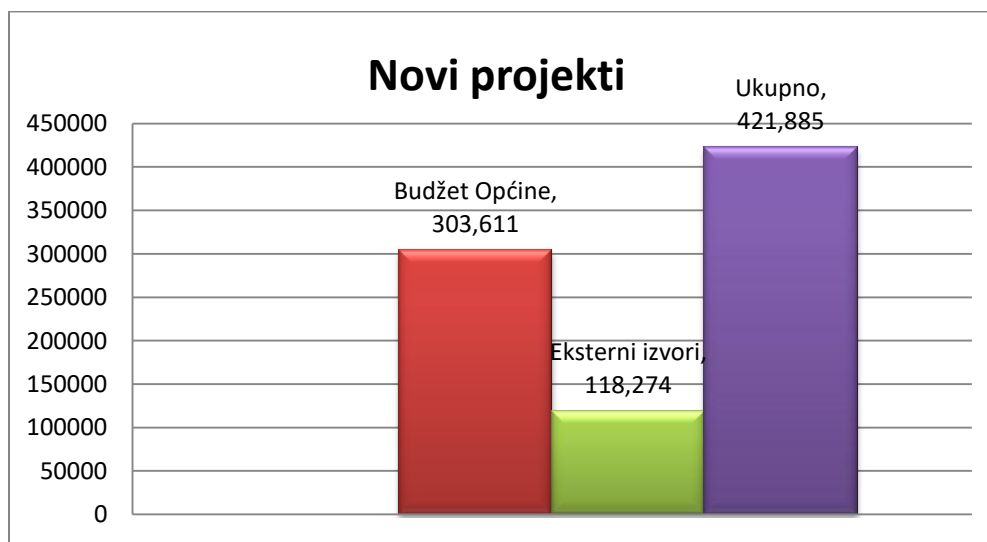

Graf 2. Projekti ekonomskog sektora koji su realizirani a nisu planirani Planom implementacije 2019-2021

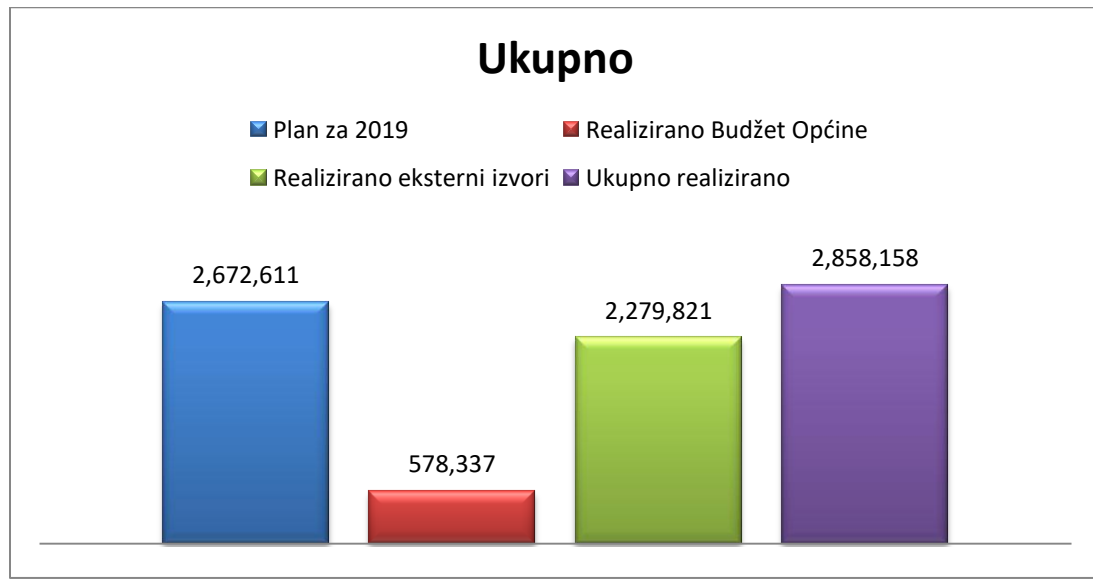

Graf 3. Ukupno planirani i novi projekti iz ekonomskog sektora

4. Sektorski ciljevi

Sektorski cilj 1.1. Poboľšano poslovno okruženje na području općine do 2020. godine, nastavljena je realizacija projekata za ostvarenje ovog cilja i to u pogledu stvaranja uslova za unapređenje poslovnog okruženja, odnosno privlačenja novih investicija uspostavljanjem poslovne zone i usklađivanja rada administracije sa zahtjevima BFC standarda, zatim usklađivanja ponude radne snage sa potrebama lokalne privrede (Projekat ILO- završen proces prekvalifikacije 54 nezaposlenih za zanimanje zavarivač – potrebnih lokalnom tržištu rada). Tokom 2019. godine se nastavlja sa daljnjim unapređenjem poslovnog okruženja, tako što je pripremljen teren i izgrađena interna saobraćajnica unutar Poslovne zone "Vatreni mlin" sa pratećom infrastrukturom (vodovod, kanalizacija, odvodnja površinskih voda).

Sektorski cilj 1.2. Osigurano prilagođavanje znanja i vještina potrebama tržišta rada i lokalnog razvoja do 2020. godine – Nastavlja se obrazovanje kadra za CNC operatere i CNC programere uz podršku Savjetodavnog vijeća Mješovite srednje škole, Privrednog vijeća i Općine Bosanska Krupa u okviru nastavnog procesa u Mješovitoj srednjoj školi "Safet Krupić" Bosanska Krupa.

Sektorski cilj 1.3. Povećan plasman poljoprivrednih proizvoda na tržište do 2020. godine – Realiziran je Pravilnik o vrsti, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu. Pravilnik se donosi na godišnjem nivou u okviru prethodno planiranih budžetskih sredstava. Sredstva sa kantonalnog i federalnog nivoa za novčane podrške su manja u odnosu na prethodne godine. Razlog ovakvoj situaciji je migracija stanovništva i odlazak u druge zemlje iz ekonomskih ili drugih razloga, čime se uočljivo smanjuje broj poljoprivrednih proizvođača. Negativan uticaj imalo je uvođenje limita od 6.000,00 KM/godišnje na novčane podrške za proizvođače koji nisu registrovali djelatnost po zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, izmjene uslova za novčane podrške u toku same proizvodnje, izmjene pravilnika kao i komplikovane procedure za apliciranje zbog čega nerijetko proizvođači odustaju od podnošenja zahtjeva. Interes za korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države se smanjuje. Sjetvene površine na području općine su manje u odnosu na prethodne godine i broj objavljenih djelatnosti i radnji fizičkih i pravnih lica je veći u odnosu na broj prijavljenih.

5. Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programskih dokumenata

R.br.	Projekat	Organizaciona jedinica	Realizirane aktivnosti
1.1.	PPVI	Služba za upravljanje razvojem	Najznačajnije strateško-programske aktivnosti u kojim je Služba za upravljanje razvojem aktivno učestvovala su bile priprema Izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana implementacije (GPI) za 2018. godinu i Plana implementacije 1+2 za period 2019-2021, te koordinacija u pripremi polugodišnjih i godišnjih planova i izvještaja u suradnji s ORT-om i drugim službama.
1.2.	BFC recertifikacija	Služba za upravljanje razvojem	U izvještajnom periodu okončan je postupak BFC recertifikacije te je dobiven BFC certifikat, a ostvaren je napredak od 87,33%. Nije bilo finansijske realizacije na ovom projektu u 2019. godini jer je ista realizirana u prethodnoj godini. Služba je bila nosilac svih aktivnosti u ovom procesu što je podrazumijevalo: organizaciju sastanaka, koordinaciju u ažuriranju postojećih dokumenata i podataka prema definiranim kriterijama te dostavljanje istih putem elektronske aplikacije.
1.3.	Projekt MEG	Služba za upravljanje razvojem	1.3.1. U periodu januar – mart su se nastavile aktivnosti u procesu procjene u okviru MEG projekta: prikupljanje i dostava podataka i dokumenata. U mjesecu martu izvršena je eksterna evaluacija. Ostvareni indikator napretka od 63% omogućio je Općini Bosanska Krupa da povuče iznos grant sredstava u vrijednosti od 133.288 KM za realizaciju infrastrukturnih projekata i 38.521 KM za realizaciju Programa poticaja.
			1.3.2. U saradnji sa Službom za obrt i poduzetništvo Služba završena procedura dodjele poticajnih sredstava za 2018. godinu, za dodjelu poticajnih sredstava za 2019. godinu proveden postupak izbora korisnika, potpisani ugovori i isplaćena prva tranša sredstava po ugovorima.
			1.3.3. Proces anketiranja je započet u decembru 2018 i okončan u januaru 2019. Nakon objavljivanja Rezultata ankete o zadovoljstvu građana javnim uslugama, Služba je sačinila Analizu rezultata mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama dobivenih u anketama provedenim 2016., 2017. i 2018. godine. Analiza je objavljena na web stranici Općine Bosanska Krupa i prosljeđena putem e-maila svim pružaocima javnih usluga te je traženo mišljenje i prijedlozi za poboljšanje usluga koje pružaju. Također je u mjesecu decembru izvršeno anketiranje građana o zadovoljstvu javnim uslugama u 2019. godini i Služba je započela sa sumiranjem rezultata ankete.

			<p>1.3.4. Odluka o subvencioniranju se provodi ali zbog nedovoljnog broja zahtjeva za subvencioniranje stepen realizacije u odnosu na planirana sredstva je manji od 20%. Održan je niz radnih sastanaka predstavnika Službe za upravljanje razvojem, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti i Centra za socijalni rad Bosanska Krupa u cilju proširivanja kategorija korisnika subvencija, a kao rezultat pripremljeni su prijedlozi izmjena Programa i Odluke o sufinansiranju kako bi se uvrstili u dnevni red na jednoj od narednih sjednica Općinskog vijeća</p> <p>1.3.5. U izvještajnom periodu Služba je bila koordinator u organizaciji radionica za uposlenike Uprave i njenih partnera, kako u Bosanskoj Krupi, tako i na drugim lokacijama u projektnom području.</p>
1.4	Projekt ILO	Služba za upravljanje razvojem	<p>Projekat ILO je trebao biti okončan do 15.12.2018. godine, te za njegovu realizaciju nisu planirana sredstva u Budžetu Općine 2019. godine. Kako je došlo do produženja projekta za tri mjeseca, bilo je neophodno rebalansom reprogramirati sredstva za Projekat ILO. Završna konferencija ILO projekta održana je 12.02.2019. godine u Bosanskoj Krupi, a zajednička završna konferencija za sve općine bila je u aprilu 2019. godine u Sarajevu. U suradnji sa partnerima pripremljen finalni izvještaj za evaluaciju projekta.</p>
1.5.	Projekt MOS	Služba za upravljanje razvojem	<p>Služba je učestvovala u realizaciji aktivnosti u Projektu međuopćinske saradnje Održivo upravljanje otpadom. Projekat je u Planu 1+2 prolongiran, ali su odobrena eksterna sredstva i realizacija projektnih aktivnosti se nastavlja u narednom periodu.</p>
1.6.	Projekat „Modernizacija Poslovne zone Pilana Plan 500+“	Služba za upravljanje razvojem	<p>Pripremljen je aplikacioni obrazac za projekat „Modernizacija Poslovne zone Pilana Plan 500+“ na javni poziv Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za dodjelu sredstava za izgradnju poduzetničkih zona. U decembru je potpisan Ugovor o dodjeli sredstava a projektne aktivnosti će se prema planu realizirati u narednoj godini.</p>
1.7.	Projekt „Efikasno upravljanje otpadnim – fekalnim vodama“	Služba za upravljanje razvojem	<p>Pripremljen je aplikacioni obrazac za prijavu na Javni poziv za kandidovanje projekata za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2019. godinu, pod nazivom „Efikasno upravljanje otpadnim – fekalnim vodama“. Ugovor o sufinansiranju projekta iz ekoloških naknada je potpisan, a realizacija se prenosi u sljedeću godinu.</p>

1.8.	PKI	Služba za upravljanje razvojem	Tehnička i druga podrška u radu Koordinacionog tima za izradu i ažuriranje PKI. Raspisan poziv za dostavu prijedloga za investiranje, otvorene pristigle prijave, pripremljeni alati za bodovanje. Izrada prijedloga ažurirane verzije PKI za period 2020-2024 kao i izvještaja o realizaciji PKI za 2019. godinu prenose se u narednu godinu.
1.9.	Privredno vijeće	Služba za upravljanje razvojem	Tehnička i druga podrška u radu Privrednog savjeta općine, održana su tri sastanka Privrednog vijeća
2.1.	Organizovanje sajмова	Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sajam organske proizvodnje, juli mjesec u saradnji sa Asocijacijom proizvođača organske hrane USK 2. Sajam pčelarstva, august mjesec u saradnji sa Uduženjem pčelara „Lipa“ Bosanska Krupa
2.2.	Anketiranje privrednika o uslovima za poslovanje	Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urađena analiza rezultata istraživanja po provedenom anketiranju privrednog sektora o uslovima poslovanja na uzorku od 50 privrednih subjekata 2. Urađena analiza potreba privrede za radnom snagom 3. Urađena analiza o procjeni privrednog sektora vezano za kratkoročne i dugoročne potrebe za radnom snagom i o poslovnom ambijentu u kojem obavljaju privrednu djelatnost.
3.1.	PROJEKAT MEG	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove	Izgrađena infrastruktura u Poslovnoj zoni Vatretni mlin. Dio ugovora bit će realiziran u 2020. godini.
4.1.	Projekat Ekonomskog osnaživanja žrtava mina i njihovih porodica	Služba za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu	Kroz projekat ekonomskog osnaživanja žrtava mina i njihovih porodica u protekloj godini realizirana su čak tri podprojekta, te je došlo do znatnog povećanja realiziranih sredstava iz eksternih izvora (202.800 KM) iako u planu implementacije iz eksternih izvora sredstva nisu planirana. Dva projekta su realizirana u suradnji sa NVO ASB Sarajevo a jedan sa NVO WORLD VISION Tuzla.

6. Zaključak

GENERALNE PREPORUKE su da se:

- popune upražnjena mjesta unutar Službe za upravljanje razvojem, Službe za komunalne djelatnosti, vode zaštitu okoliša i inspekcijske poslove te Službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo (šefovi organizacionih jedinica jer nijedna od ovih službi nema šefa; Stručni savjetnik za ekonomski razvoj, Stručni savjetnik za društveni razvoj; Stručni saradnik za dijasporu i investicije)
- osigura svakodnevna i dosljedna primjena PPVI procedura;
- uvede redovna praksa tematskih (mjesečnih/kvartalnih) sastanka o implementaciji Strategije;
- kontinuirano jača interna i eksterna komunikacija po pitanju implementacije, praćenja i izvještavanja realizacije Strategije;
- popunjavanje i redovno ažuriranje PROreg aplikacije;
- razvija koordinacija sa partnerskom grupom unapređenjem puteva komunikacije i većim uključenjem civilnog sektora i privrednika;
- izvrši revitalizacija partnerske grupe te redovno (periodično) organiziraju konsultacije o godišnjim planovima i ostvarenim rezultatima implementacije Strategije;
- osnažuju kapaciteti lokalne uprave i aktera iz užeg i šireg okruženja kako za pisanje projekata, tako i lobiranje i druge oblike privlačenja vanjskih izvora finansiranja implementacije Strategije;
- da se u budžetu općine planira više sredstava za podršku projektima po javnim pozivima i projektima prekogranične saradnje;
- uvede redovna praksa objavljivanja općinskoj web stranici godišnjih planova i izvještaja o realizaciji strateških prioriteta.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE
RAZVOJEM
